

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ- PARANÁ  
CHEFIA DE GABINETE

Ofício N°693/2020

Carambeí, 08 de setembro de 2020

Excelentíssimo Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**  
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo  
**PROTOCOLO GERAL 0230**  
**08/09/2020 15:00**  
**OFÍCIO N° 693/2020 GAB RESPOSTA AO OFÍCIO**  
**N° 398/2020**

Venho através do presente, em atenção ao ofício n°398/2020, da Câmara Municipal, encaminhar o ofício n°398/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, com as informações solicitadas pelos nobres vereadores.

Na oportunidade aproveitamos o ensejo para renovar os votos de estima e consideração.

Inácio Povaz Filho  
Chefe de Gabinete do Prefeito

Excelentíssimo Senhor:  
DIEGO DE JESUS DA SILVA  
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Carambeí-PR  
NESTA



# Município de Carambei

## Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Carambei, 04 de setembro de 2020.

**Ofício n.º 320/2020-SPU**

Ao Sr.

**Inácio Povaz Filho**


Chefe de Gabinete do Prefeito

Ref.: Ofício nº 572/2020 – Gabinete; Ofício nº 398/2020 – Câmara; Memorando nº 29/2020

Prezado Senhor,

Em atenção aos ofícios e memorando referenciados acima, informo que a empresa AR Construtora de Obras Ltda recebeu a Notificação nº 2 e está tomando as providências necessárias para a conclusão da obra.

Atenciosamente,

  
**Flávia Lima Schroeder**  
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

*Flávia Lima Schroeder*  
423  
04/09/2020  
*Laisa*

## Notificação nº 2

Referência: EDITAL TOMADA DE PREÇOS nº 26/2019

Contrato: 268/2019

Empresa: A.R. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (CNPJ: 30.406.445/0001-37)

Objeto: Pavimentação de Vias Urbanas – Rua das Acácias, Gerânios, Ipê, Antúrios e Madressilvas.

Prazo de Execução: 120 dias - Ordem de Serviço nº 03/2020 (25 de março de 2020) -- Aditivo 90 dias, findando em 23/10/2020.

Valor: R\$ 503.281,62

A Prefeitura Municipal de Carambei – Secretaria de Planejamento e Urbanismo – através da fiscal da referida obra, Eng.<sup>a</sup> Civil Flávia Lima Schroeder, CREA PR n.º 121.306/D, notifica a empresa A.R. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (CNPJ: 30.406.445/0001-37) para que realize ações visando a celeridade da obra, uma vez que a mesma encontra-se em execução à 150 dias da data de início da Ordem de Serviço, com pouca evolução, bem como providências para garantir a limpeza e organização da obra.

Segue em anexo o Memorando nº 29/2020 – Câmara Municipal de Carambei - Gabinete do Vereador Paulo Sergio Valenga.


Vale lembrar, que:

- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra é da executante;
- Compete à empreiteira tomar as medidas necessárias para que os materiais transportados não causem danos as vias, aos usuários e ao meio ambiente. Eventuais danos causados a terceiros são de inteira responsabilidade da empreiteira, a quem cabe o ônus decorrente;
- É de total responsabilidade da executante a concepção, a implantação, a operação e o remanejamento da sinalização provisória da obra, de acordo com a evolução das frentes de serviço, de forma a conferir segurança ao tráfego e ao pessoal em serviço, bem como minimizar transtornos aos usuários.

Carambei, 25 de agosto de 2020.

  
Eng.<sup>a</sup> Flávia Lima Schroeder  
Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
Prefeitura Municipal de Carambei

  
Paulo Sergio Valenga  
25/08/20



Curitiba, 28 de agosto de 2020

A  
Prefeitura Municipal de Carambei  
Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
Eng<sup>a</sup> Flávia Lima Schroeder

Referente: Contrato 268/2019

A R Construtora de Obras Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.406.445/0001-57, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Santo Antônio, 555, C2, Rebouças, Curitiba, Paraná, detentora do Contrato n.º 268/2019, em resposta a notificação 2, emitida em 25/08/2020.

Informamos que, estamos finalizando a etapa de base, drenagem, acabamento de meio fio para iniciar a pavimentação asfáltica, concomitantemente estamos executando as calçadas e rampas de acesso para deficientes.


Reiterando, um dos fatores que impactou no atraso da execução da obra foi a dificuldade de obter o deferimento no pedido de realocação dos postes da copel, impedindo a execução de galerias bem como a pavimentação, devido um destes estar localizado na pista de rolamento. A realocação destes está programada para o dia 31/08/2020.

Alguns incômodos são inevitáveis quando se trata de uma obra de implantação em ruas com moradias já consolidadas, porém a empresa contratada vem trabalhando para sanar todos os percalços ocorridos. Reafirmamos o nosso compromisso de concluir a obra com qualidade, solidez e segurança.


Segue fotos em anexo, evidenciando a evolução da obra.

  
A R Construtora de Obras Ltda



Thiago Piaskowski  
Engenheiro Civil  
Crea PR - 183.647/D

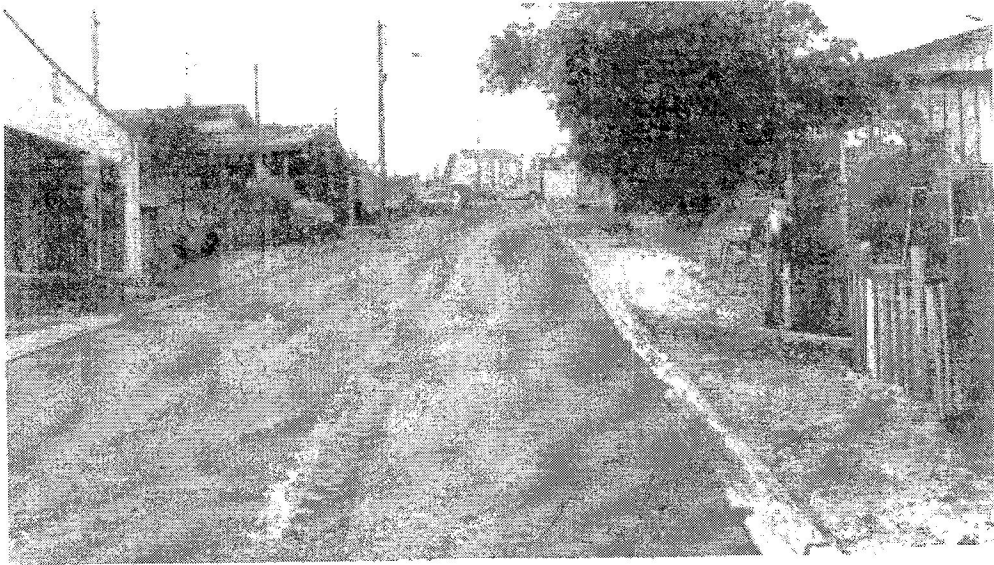


1 – Finalização da Base na Rua das Acácias

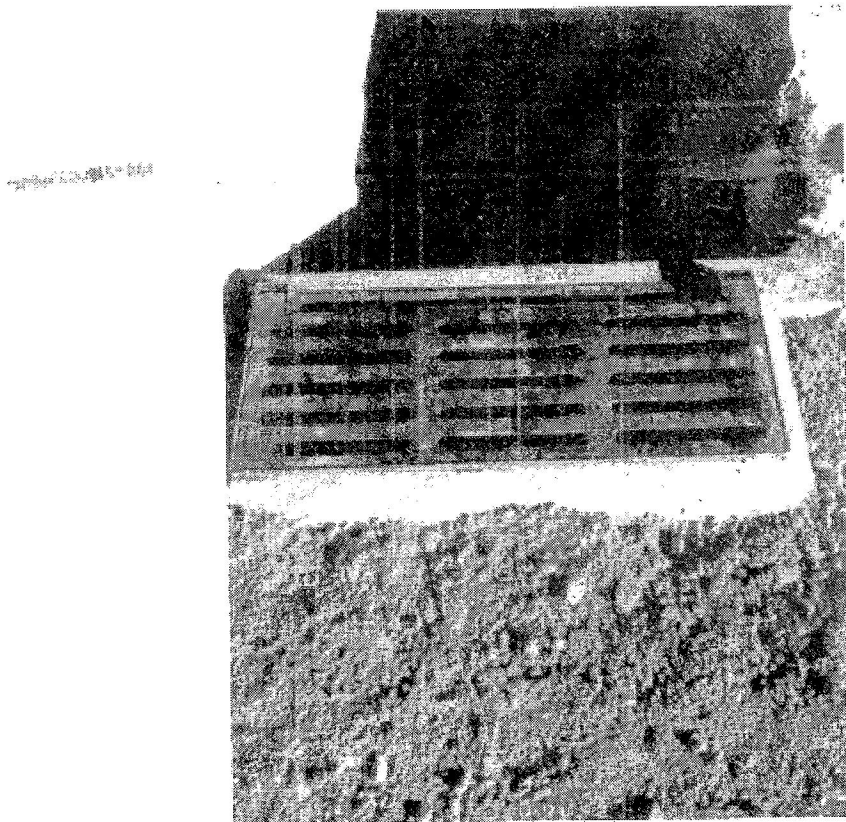


2 – Assentamento das Grelhas nos dispositivos de drenagem

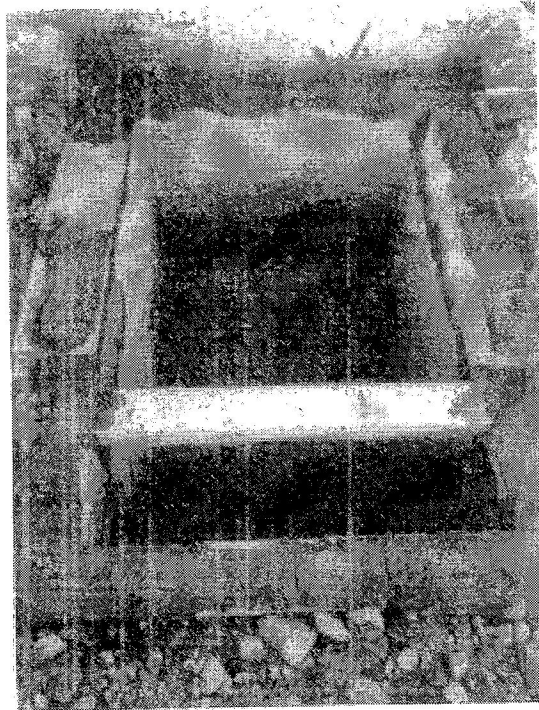


3 – Regularização dos dispositivos de drenagem

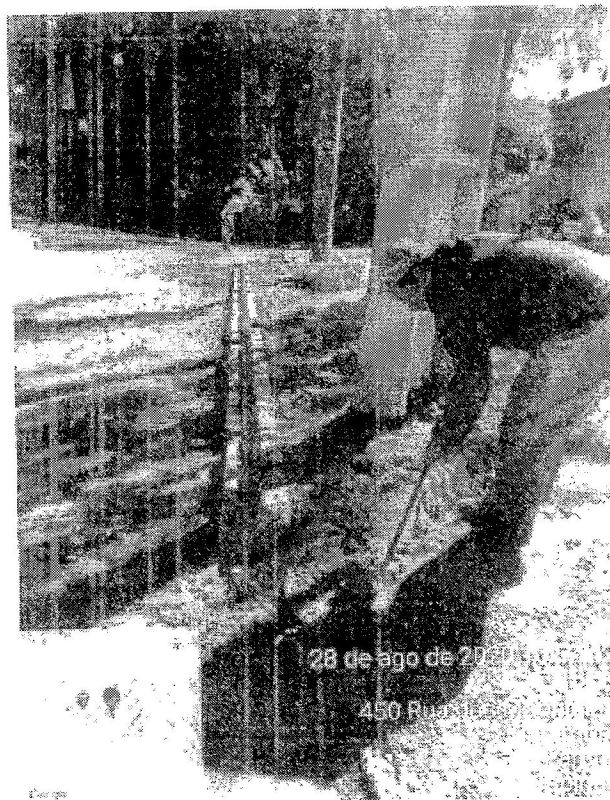


4 – Assentamento de meio fio na Rua dos Gerânios

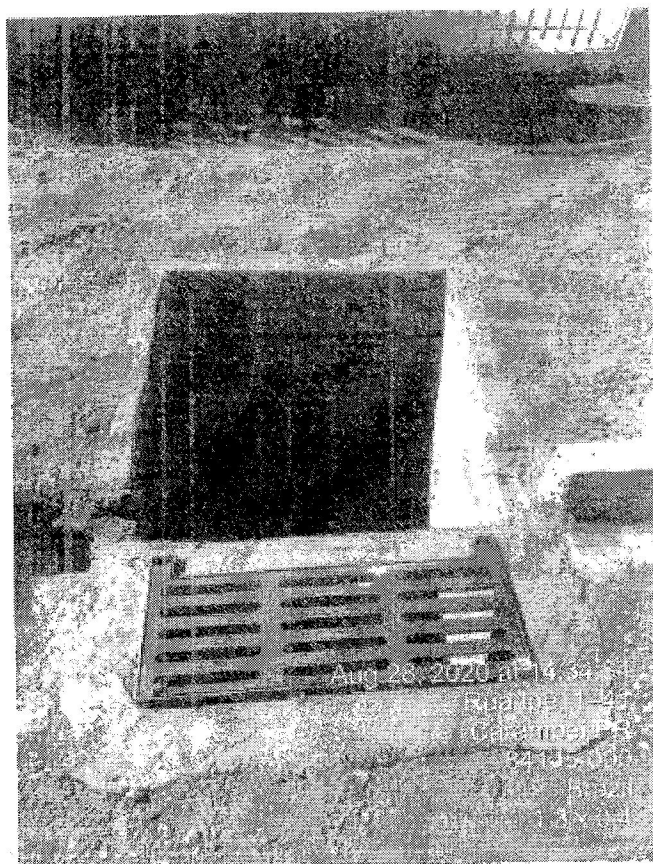


7 – Acabamentos nos dispositivos de drenagem

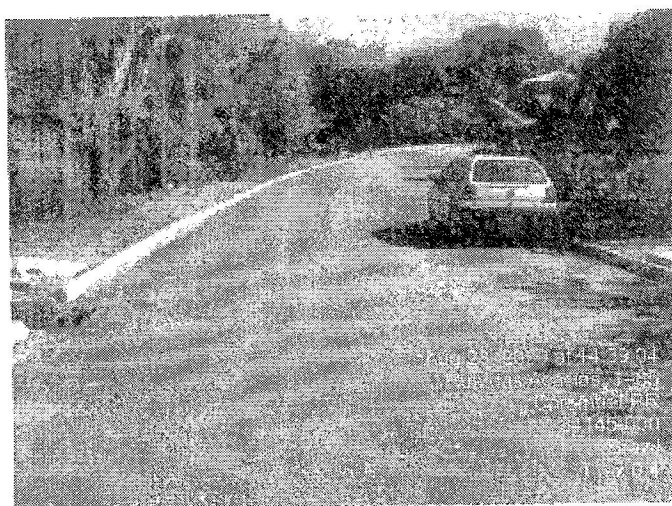

8 – Finalização da base na Rua dos Antúrios

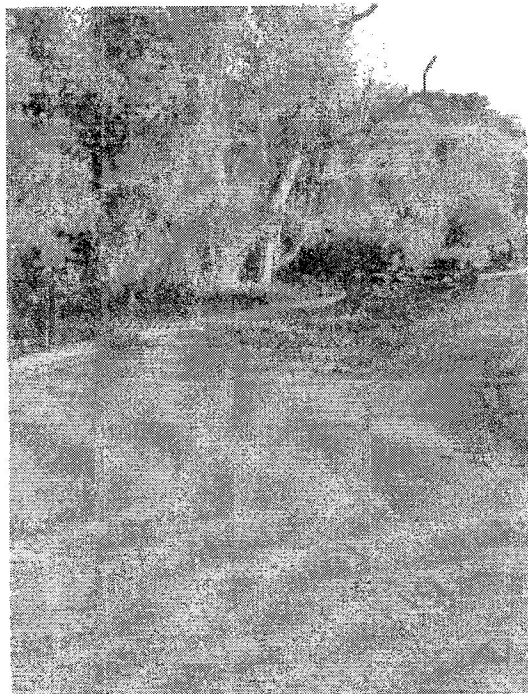

9 – Sinalização do material não conformizado (07/08/2020)

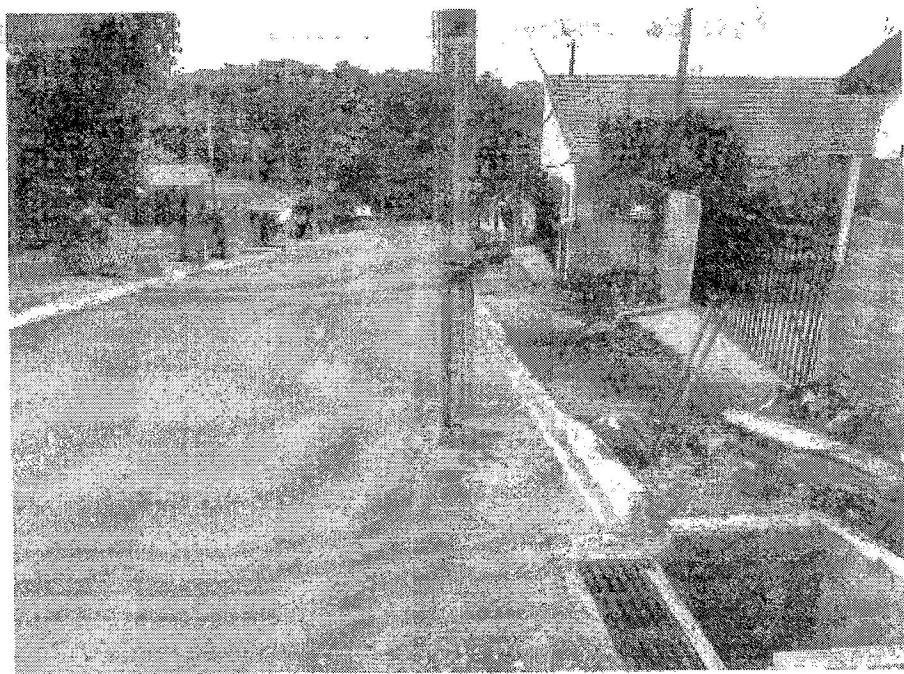

10 – Poste alocado dentro da pista de rolamento
